



Présentation de la formation

MS Project 2013, Planification

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Introduction
- Commandes de base du logiciel
- Premières étapes
- Création et manipulation des tâches
- Propriétés de base des tâches
- Manipulations particulières avec les tâches
- Préparation du fichier pour envoi aux responsables d'équipes
- Clôture de la formation



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Présentation du formateur

- Vincent ISOZ
- vincent.isoz@scientific-evolution.com
- Consultant scientifique
- Mission conseil, migration et formation
- Bsc. Physique
- Mes références :
 - Mon profil **Alphorm** : <http://www.alphorm.com/auteur/vincent-isoz>
 - Mon site perso: <http://www.sciences.ch>



Remarques

- Objectifs (pourquoi cette formation?)
- Prérequis (matériel et connaissances)
- Audience (public cible)
- Références bibliographiques + Liens Internet
- Hypothèses
- Validation des acquis (certifications)
- Support post formation
- Avertissements
- Et après...?

 Are you ready?

LET'S
GO



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Commandes de base du logiciel

Nouvelle interface

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Changer la couleur de l'interface
- Reconnaître la version Standard de la version Pro
- Découverte de la nouvelle interface pour ceux venant de la version 2007 (menu fichier (coulisses), barre d'accès rapide, ruban, onglets, onglets contextuels, boutons avec légendes, options avancées des groupes)
- Raccourcis clavier
- Gagner de la place à l'écran (réduction ruban, désactivation d'éléments peu critiques)



Ce qu'on a couvert

Les différences entre l'interface 2007 et 2013 et le vocabulaire officiel des éléments visibles à l'écran.





Alphorm.com

Commandes de base du logiciel

Menu contextuel

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

Les X manières de faire une action identique dans les logiciels de la gamme Microsoft Office (exemple avec la création d'une tâche) dont le menu contextuel.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Différentes approches pour effectuer des actions dans le logiciel.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Commandes de base du logiciel En arrière des coulisses : **l'onglet Fichier**

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ
Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Enregistrer le fichier et respect des normes de nommages
- Compatibilité descendante
- Convention de versionning dans le nom des fichiers
- Activer la copie de sauvegarde lors de l'enregistrement
- Protection du fichier par mot de passe/Suppression du mot de passe
- Fermer/Ouvrir un fichier existant
- Fichiers et dossiers récents (punaises) et purger la liste
- Métadonnées du fichier
- Création d'un nouveau projet vide à partir du modèle d'entreprise



Ce qu'on a couvert

- Les éléments majeurs disponibles dans le menu fichier lors d'une utilisation en standalone (pas de SharePoint/pas de Project Server).





Alphorm.com

Commandes de base du logiciel

Options de configuration de base importantes

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Choisir son format de dates
- Choisir son format monétaire
- Activation de la Barre de saisie
- Début/Fin et durées des unités temporelles par défaut
- Type de tâche
- Activer l'enregistrement automatique
- Désactiver les assistants
- Définir le chemin critique
- Activer l'export des fichiers hérités



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Options de configuration considérées comme fondamentales dans le cadre de la planification pure d'un projet (sans ressources et sans coûts).



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Premières étapes Nouveau projet

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Création d'un nouveau projet
- Définir les métadonnées
- Définir les informations du projet et choix ASAP/ALAP



Ce qu'on a couvert

- Comment bien commencer à partir d'un modèle vide ou d'entreprise ou de poursuivre depuis un fichier reçu.





Alphorm.com

Premières étapes

Création et personnalisation du calendrier de projet

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Création d'un calendrier de projet
- Convention de nommage pour projet internationaux
- Définition des jours ouvrés
- Définition des heures ouvrées
- Définition d'exceptions et piège des exceptions périodiques
- Définition de semaines de travail
- "Organiser" le calendrier



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Les minimum syndical quant à la création d'un calendrier de projet unique.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Premières étapes

Associer un calendrier à des vues particulières

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Associer un calendrier à un affichage de son choix
- Biais de zoom
- Couleurs des jours chômés?
- Superposition de calendriers?
- Fuseaux horaires multiples?



Ce qu'on a couvert

L'affectation d'un calendrier à un affichage et limites fréquemment rencontrées par les utilisateurs





Alphorm.com

Premières étapes

Associer un calendrier à des tâches particulières

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Comprendre quel est le calendrier assigné par défaut aux tâches
- Associer un calendrier particulier à une tâche particulière



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

L'association d'un calendrier à une tâche.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Création et manipulation
des tâches

Création de tâches

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Activer la tâche récapitulative
- Activer les codes hiérarchiques
- Créer des jalons tampons (jalonnement)
- Bonne pratique concernant les noms de tâches
- Création de phases (phasage)
- Création et hiérarchisation de jalons et de tâches dans les phases (ordonnancement)
- Création et personnalisation de tâches périodiques



Ce qu'on a couvert

Le jalonnement, le phasage et l'ordonnancement des tâches d'un planning de projet.





Alphorm.com

Création et manipulation
des tâches

Saisir les différents types de durées

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Rappel sur la durée sous-jacente aux unités temporelles
- Différencier les durées estimées de non estimées
- Durées travaillées versus durées écoulées



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Les différents types de durées disponibles dans le logiciel.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Création et manipulation
des tâches

Changement de la structure
et formatage dynamique

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Formater le texte
- Formater les cellules
- Ajout de lignes vides
- Formater les barres de tâches



Ce qu'on a couvert

Quelques techniques de formatages triviales suffisantes pour la planification de petits projets.





Alphorm.com

Création et manipulation
des tâches

Rappels théoriques sur les
liaisons

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan


- Utilité des liaisons!?
- Connexité?
- Liaisons FD, DD, FF, DF
- Comprendre la dynamique maître/esclave (prédécesseur/successeur)
- Piège à éviter avec les phases



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Types de liaisons

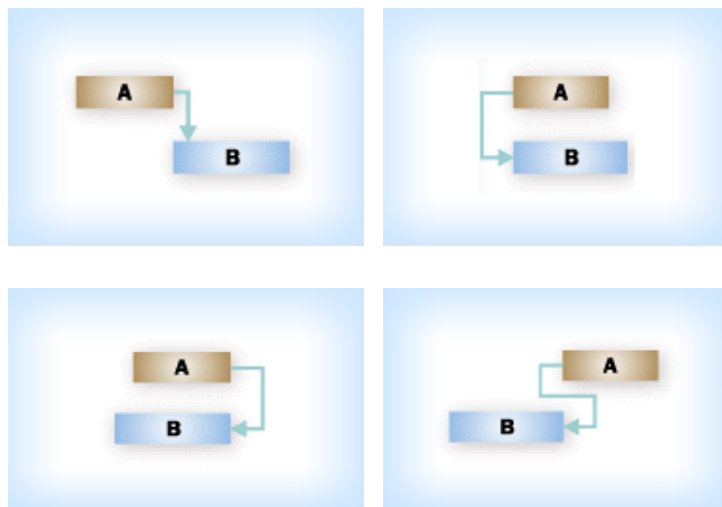

Ce qu'on a couvert

Un rappel théorique pour bien comprendre les tenants et aboutissants des liaisons (en absence de contrainte et sans avancement!!!).





Alphorm.com

Création et manipulation
des tâches

Création de liaisons

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Mettre toutes les tâches et nouvelles tâches en mode planifié automatique
- Création de liaisons FD, DD, FF, DF de différentes manières
- Masquer les liaisons
- Mettre en évidence les prédécesseurs ou successeurs



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Les différentes manières de créer des liaisons dans MS Project.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Création et manipulation
des tâches

Création de délais

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Définition de délais en durées ouvrées, écoulées ou en %... et estimés
- Bonne pratique: Délai dans liaison ou délai en tâche?



Ce qu'on a couvert

Les différentes manières de définir des délais et des conseils de bonne pratique.





Alphorm.com

Création et manipulation
des tâches

Opérations diverses élémentaires

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Copier/Coller des tâches
- Glisser/Déplacer des tâches
- Changer une propriété de plusieurs tâches simultanément
- Effectuer une recherche de tâche
- Déplacement rapidement à une tâche donnée ou une date donnée
- Changer l'arrondi visuel des tâches
- Changer la hauteur des tâches
- Masquer des lignes ou colonnes?



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Des manipulations triviales esthétiques et opérationnelles concernant les tâches et fréquemment utilisées avec quelques pièges/limitations mis régulièrement en évidence par les utilisateurs.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Propriétés de base des tâches
Exemple d'utilisation du mode
manuel ou automatique

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ
Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Rappel sur les conflits de versions de Project
- Mode manuel vs automatique pour les dates et durées
- Mode manuel vs automatique pour la dynamique de la mise à jour en cascade des liaisons
- Forcer le respect des liaisons
- Absurdités actuelles du logiciel...



Ce qu'on a couvert

Une clarification d'une option souvent déroutante pour les débutants utilisateurs du logiciel et nouvelle depuis MS Project 2010.





Alphorm.com

Propriétés de base des tâches

Définir les contraintes strictes,
fortes ou faibles sur les tâches

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Utilisation des contraintes faibles
- Utilisation des contraintes fortes
- Utilisation des contraintes strictes
- En cas de violation de contrainte que faire?
- Et les doubles contraintes?
- Option de respect des contraintes?
- Rendre les contraintes visibles sur le Gantt
- Visualiser l'impact sur la marge totale
- Un mot sur les contraintes et le chemin critique dans MS Project



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

L'utilisation des contraintes qui sont indispensables à tout projet réel et aussi les limites inhérentes au logiciel relativement à celles-ci.



Alphorm.com

Propriétés de base des tâches

Définir les échéances
(deadline)

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

Plan

- Rappel sur la définition d'usage d'une Échéance vs Contrainte
- Application d'une deadline
- Comportement d'une tâche au dépassement d'une échéance et comparaisons avec le dépassement d'une contrainte



Ce qu'on a couvert

La définition d'échéances et leur différenciation par rapport aux contraintes.





Alphorm.com

Propriétés de base des tâches

Analyser le chemin critique

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Rappel de la définition du chemin critique
- Rappel sur l'activation du calcul des chemins critiques multiples
- Afficher le chemin critique
- Rappel sur l'affichage des marges totales
- Ajouter les colonnes de marge libre et marge total
- Rappel sur l'influence des contraintes et échéances!



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Le concept majeur de chemin critique pour ceux qui veulent optimiser ou inversement éviter les goulets d'étranglement de leurs projets.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Manipulations
particulières des tâches

Fractionnement des tâches

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Pourquoi fractionner une tâche?
- Bonne pratique?
- Pourquoi est-ce délicat?
- Utilisation de l'outil fractionnement
- Masquer les fractionnements



Ce qu'on a couvert

Toutes les notions relatives au fractionnement de tâches.





Alphorm.com

Manipulations particulières des tâches

Tâches de hammock

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Définition d'une tâche (de) hammock
- Danger avec MS Project
- Comment se rappeler de l'élément maître
- Création d'un exemple typique de tâche (de) hammock
- Suppression de la liaison (de) hammock
- Message à l'ouverture d'un fichier incluant une tâche (de) hammock



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Tout ce qu'il faut savoir sur le "bricolage" des tâches de hammock avec MS Project.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Manipulations particulières des tâches

Liaison avec MS Excel

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Pourquoi lier avec MS Excel?
- Est-ce une pratique conseillée?
- Création/Suppression d'une liaison de Project à Excel
- Création/Suppression d'une liaison de Excel à Project
- Message à l'ouverture d'un fichier comportant des liaisons externes
- Gestion de liaisons



Ce qu'on a couvert

Un bricolage fréquent et malheureux... mais souvent demandé d'où cette petite présentation.





Alphorm.com

Manipulations
particulières des tâches

Utilisation de tâches "fantômes" et masquage de tâche

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Définition de l'utilité des tâches fantômes
- Danger de l'utilisation des tâches fantômes
- Problématiques de l'utilisation des tâches fantômes
- Exemple de l'utilisation d'une tâche fantôme



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Un bricolage parfois obligatoire et désolant pour faire commencer dynamiquement des tâches un jour particulier des semaines ou des mois (cette fonctionnalité devrait être nativement intégrée!).



Alphorm.com

Manipulations particulières des tâches

Marquer une tâche en tant que jalon et désactivation d'une tâche

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ
Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

Plan

- Marquer une tâche en tant que jalon
- Désactivation d'une tâche (version Pro seulement)



Ce qu'on a couvert

Deux petites options accessoires relativement aux tâches mais toutefois parfois très utiles.





Alphorm.com

Manipulations
particulières des tâches

Report de tâches

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Utilité du report de tâches
- Exemple d'utilisation de l'option de report



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Une petite option fréquemment utilisée par les petits hôtels ou centres de congrès.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Préparation du planning pour envoi

Définir la W.B.S.

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Définition théorique de la W.B.S.
- Utilité de la W.B.S.
- Construction de la W.B.S. (avec ou sans MS Visio?)
- Renumérotation de la W.B.S.
- Bugs et problèmes relatifs à la W.B.S. dans MS Project



Ce qu'on a couvert

Définition dans MS Project de la W.B.S. et problèmes y relatifs





Préparation du planning pour envoi Insertion de notes et pièces jointes dans les tâches

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Objectif de la centralisation de l'information
- Limite de capacité des fichiers *.mpp
- Création d'une note de texte simple
- Ajout d'un hyperlien dans une note
- Insertion d'une ou plusieurs pièces jointes non liées
- Insertion d'une ou plusieurs pièces jointes avec liaison
- Supprimer toutes les notes d'un coup



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Une fonctionnalité accessoire mais infiniment utile pour faciliter et rationaliser la gestion des fichiers d'un projet en l'absence de Project Server ou de SharePoint/Office 365.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Préparation du planning pour envoi
Activation de la grille et des
références utiles dans le Gantt

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ
Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Activation de la grille du Gantt pour faciliter la lecture à l'écran ou à l'impression
- Activation de certaines lignes de référence dans le Gantt pour avoir de meilleurs repères



Ce qu'on a couvert

L'activation de certains éléments visuels très demandés par les utilisateurs expérimentés pour améliorer le confort de lecture.





Alphorm.com

Préparation du planning pour envoi

Préparation du zoom ou de l'échelle de temps

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Découverte des différentes options de zoom
- Personnalisation typiques de l'échelle de temps avec trois tiers



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

La maîtrise des techniques de zoom qui sont aussi utiles dans le cadre du reporting et pas seulement dans le cadre de la planification pure.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Préparation du planning pour envoi

Création d'une colonne calculée simple avec la durée cumulée

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Prétexte à la présentation du concept de formules dans les champs personnalisés du logiciel
- Ajout d'une colonne du différentiel de temps ouvrable, du temps cumulé pour les phases ou du temps travaillé (en l'absence d'utilisation de ressources)
- Consulter les champs personnalisés dans les propriétés des tâches
- Organisation des champs sur plusieurs fichiers projets
- À propos de la synchro automatique des champs?



Ce qu'on a couvert

Quelques exemples de formules triviales simplifiées à l'extrême juste pour présenter le concept des formules qui sont normalement étudiées en détails lors des techniques de suivi de projets et du reporting.





Alphorm.com

Préparation du planning pour envoi

Création d'une colonne avec
le nom des responsables
d'équipes

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Prétexte à la présentation du concept de liste déroulante dans les champs personnalisés du logiciel
- Exemple d'une liste déroulante avec une erreur fréquente relative aux responsable des tâches (non exécutants mais juste superviseurs) sans Project Server
- Consulter les champs personnalisés dans les propriétés des tâches
- Organisation des champs sur plusieurs fichiers projets
- À propos de la synchro automatique des champs?



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Un exemple ultra classique de champ personnalisé avec une liste déroulante.



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©



Alphorm.com

Préparation du planning pour envoi

Création d'une colonne avec un code hiérarchique VBS

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Utilité des codes hiérarchiques (WBS, RBS, OBS, LBS, VBS)
- Codes hiérarchiques préexistants dans MS Project
- Création et utilisation d'une code hiérarchique
- Organisation des champs sur plusieurs fichiers projets
- À propos de la synchro automatique des champs?



Ce qu'on a couvert

L'ajout d'un code hiérarchique particulier aux tâches du projet (le concept étant exactement le même pour les ressources).





Alphorm.com

Préparation du planning pour envoi

Notions élémentaires de filtrage et regroupement

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Plan

- Utilisation des filtres dans les colonnes
- Création et utilisation d'un groupement à un niveau



MS Project 2013, Planification

alphorm.com™©

Ce qu'on a couvert

Une mise en bouche des filtres et groupements qui bien que rarement mis en pratique dans le cadre de la planification pure sont intensément utilisés lors du suivi de projets et du reporting.



Alphorm.com

Conclusion

Site : <http://www.alphorm.com>
Blog : <http://www.alphorm.com/blog>
Forum : <http://www.alphorm.com/forum>

Vincent ISOZ

Formateur et Consultant indépendant
Ingénierie statistique et financière

Ce qu'on a couvert

- Comment faire une planification "pure" d'un projet avec rigueur
- Présentations de bonnes pratiques et d'astuces
- Les nombreuses limites problématiques à ce jour du logiciel
- Tout ce qu'il faut pour apprendre la suite (gestion des ressources, gestion des coûts, suivi de projets, gestion de portefeuilles, audit & reporting, macros & VBA)

